

사업 목표

대저1, 2동 상습침수지인 자연재해위험개선지구에 대하여 배수펌프장 설치 등 배수시설 정비를 통한 침수해소 및 지역주민 피해 방지

■ 추진방향

- 대저1, 2 자연재해위험개선지구는 낙동강 홍수위보다 낮은 저지대로서 집중호우 시 낙동강 수위상승으로 내수배제가 불가하여 침수피해 발생
- 배수펌프장 등을 설치하여 집중호우 시 강제 배수를 통해 대저1, 2동 일원에 대한 침수를 방지하고자 함.

■ 우선순위 : 중장기사업(2022년)

■ 사업개요

① 대저1 자연재해위험개선지구 정비사업

- 사업규모 : 신덕배수펌프장($Q=1,500\text{m}^3/\text{min}$, $V=12,000\text{m}^3$)
사덕배수펌프장($Q=310\text{m}^3/\text{min}$, $V=3,000\text{m}^3$)
- 사업비 : 484억원(국비 242, 시비 242)

② 대저2 자연재해위험개선지구 정비사업

- 사업규모 : 덕두배수펌프장 설치($Q=255\text{m}^3/\text{min}$, $V=5,000\text{m}^3$)
동방배수펌프장 성능개선($Q=720\text{m}^3/\text{min}$, $V=7,000\text{m}^3$)
- 사업비 : 268억(국비 134, 시비 134)

※ 재원조달계획

[대저1 자연재해위험개선지구 정비사업]

[단위 : 백만원]

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년이후
계	48,374	15,250	6,150	10,000	16,974	
국비	24,187	9,500	4,400	5,000	5,287	
시비	24,187	5,750	1,750	5,000	11,687	
구비						
기타						

[대저2 자연재해위험개선지구 정비사업]

[단위 : 백만원]

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년이후
계	26,810	11,410	3,359	9,355	2,686	
국비	13,405	9,050	1,500	2,855	-	
시비	13,405	2,360	1,859	6,500	2,686	
구비						
기타						

■ 세부 추진계획

[단위 : 백만원]

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
대저1 자연재해위험개선지 구 정비사업	총계	신덕배수펌프장(Q=1,500m ³ /min, V=12,000m ³) 사덕배수펌프장(Q=310m ³ /min, V=3,000m ³)	48,374	
	2018년	■ 사덕배수펌프장 공사 발주(8월)	15,250	국 9,500 시 5,750
	2019년	■ 신덕배수펌프장 공사 발주(5월)	6,150	국 4,400 시 1,750
	2020년	■ 사덕배수펌프장 공사 준공(9월)	10,000	국 5,000 시 5,000
	2021년	■ 신덕배수펌프장 공사 추진	16,974	국 5,287 시 11,687
	2022년	■ 신덕배수펌프장 공사 준공(2월)		
대저2 자연재해위험개선지 구 정비사업	총계	덕두배수펌프장(Q=255m ³ /min, V=5,000m ³) 동방배수펌프장(Q=720m ³ /min, V=7,000m ³)	26,810	
	2018년	■ 1차 공사 착공(10월)	11,410	국 9,050 시 2,360
	2019년	■ 2차 공사 착공(5월)	3,359	국 1,500 시 1,859
	2020년	■ 1차 공사 준공(2월) ■ 2차 공사 준공, 3차 공사 착공(4월)	9,355	국 2,855 시 6,500
	2021년	■ 전체 공사 준공예정(4월)	2,686	시 2,686

■ 연도별 추진일정

① 대저1 자연재해위험개선지구 정비사업

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
사덕배수펌프장	████████████████████					
신덕배수펌프장		████████████████████				

② 대저2 자연재해위험개선지구 정비사업

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
동방배수펌프장	████████████████████					
덕두배수펌프장		████████████████████				

■ 추진실적

① 대저1 자연재해위험개선지구 정비사업

- '18. 8. : 사덕배수펌프장 공사 착공
- '19. 8. : 신덕배수펌프장 공사 착공 (1차 준공 '20.6. 2차 착공 '20.3.)

② 대저2 자연재해위험개선지구 정비사업

- '18.10. : 1차 공사 착공 (1차 준공 '20. 2.)
- '19. 5. : 2차 공사 착공
- '20. 4. : 3차 공사 착공

■ 향후 추진계획

① 대저1 자연재해위험개선지구 정비사업


- '20. 9. : 사덕배수펌프장 공사 준공
- '22. 2. : 신덕배수펌프장 공사 준공(2차 준공예정 '21.4.)

② 대저2 자연재해위험개선지구 정비사업

- '20. 7. : 2차 공사 준공
- '21. 4. : 전체공사 준공

■ 위치도

대저1 자연재해위험개선지구 정비사업

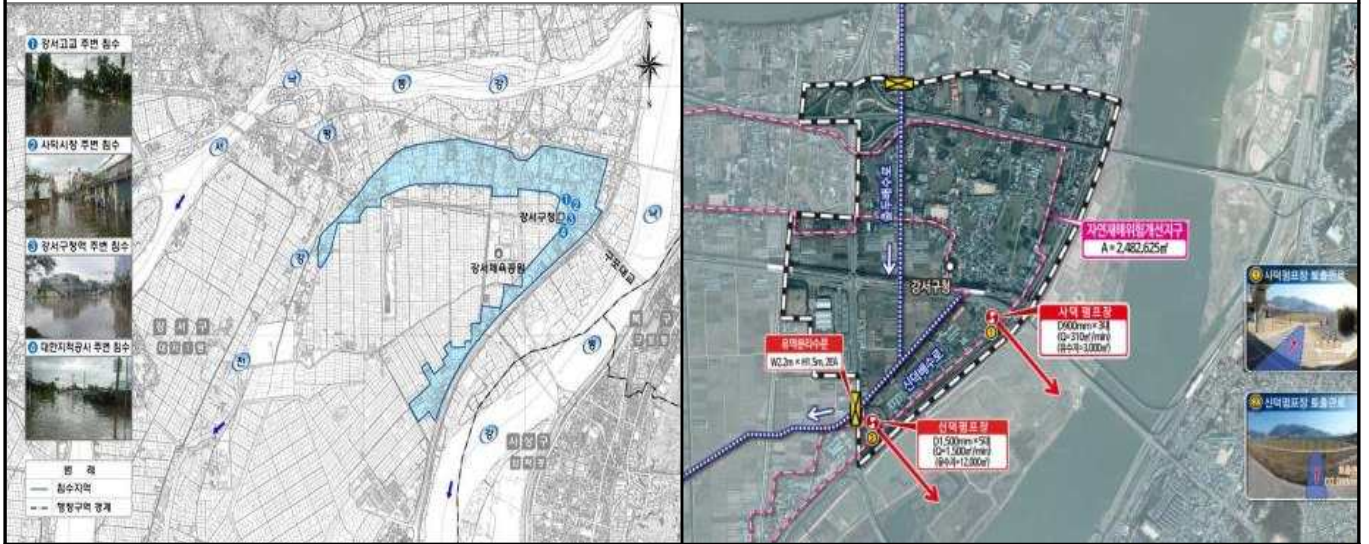

대저2 자연재해위험개선지구 정비사업

