

✓ 사업구분	사·자·체·타·기·민(나, 수자원공사)	✓ 예산구분	예 산
✓ 사업기간	중장기(임기 내)	✓ 신규여부	계 속

❖ 사업목표(추진방향)

낙동강과 구 전체를 아우르는 생태탐방로 조성으로 낙동강의 우수한 수변경관과 다른 자연 자원과 연계를 통한 낙동강 110리 탐방로 조성

❖ 사업개요

- 사업명 : 낙동강 110리 둘레길 조성
- 사업기간 : 2022년 ~ 2028년
- 사업구간 : 총 길이 44.1km(110리)
- 사업내용
 - 낙동강과 구 전체를 아우르는 걷고 싶은 낙동강110리 둘레길 조성
 - 강, 습지, 철새 등 자연생태환경과 연계된 즐겁고 안전한 보행 환경 조성
 - 완료구간
 - 1코스(대저수문~명지IC, 16km) : 낙동강 제방길(벚꽃길)로 기 조성됨
 - 2코스(명지IC~명지오션시티~신호대교, 7.1km) : 갈맷길로 기 조성됨
 - 중기사업구간(25년 준공 예정)
 - 3코스(신호대교~명지 순아3구, 3.1km) : 명지국제신도시 근린공원NH공사 추진
 - 4코스(명지 순아3구~강동동 중곡, 4.7km) : 에코델타시티 수변공원1,2,3호(수자원공사 추진)
 - 장기사업구간
 - 5코스(강동동 중곡~김해교 7.2km) : 제2에코델타시티 서부산권 복합산업단지(28년 준공 예정)
 - 6코스(김해교~대저수문, 6km) : 친수공간 구상 마스터플랜 수립 용역(도시정비과)

❖ **확인지표** : 3,4코스 완공, 5,6코스 착공

❖ **재원조달 계획**

[단위 : 백만원]

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	400	-	400	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-
구 비	400	-	400	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-

❖ **세부 추진계획**

[단위 : 백만원]

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
낙동강110리 둘레길 조성	총 계		400	
	2022년	▪ 4코스(에코델타시티) 2구역 공사 착공		
	2023년	▪ 4코스(에코델타시티) 1구역 준공 예정 ▪ 5코스(서부산권 복합산업단지) GB해제 추진 ▪ 5코스(제2에코델타시티) 기본계획 수립 ▪ 6코스 서낙동강 친수공간 구상 마스터플랜 수립(용역)	400	6코스 용역비
	2024년	▪ 3코스(명지국제신도시) 공사 착공 ▪ 5코스(제2에코델타시티) GB해제 추진 ▪ 6코스 서낙동강 친수공간 구상 마스터플랜 수립 용역 결과에 따라 둘레길 조성 추진		
	2025년	▪ 3코스(명지국제신도시) 준공 예정 ▪ 4코스(에코델타시티) 2구역 준공 예정 ▪ 5코스(제2에코델타시티, 서부산권 복합산업 단지) 착공 예정		
	2026년	▪ 5코스 공사 진행		
	2027년 이후	▪ 5코스(제2에코델타시티, 서부산권 복합산업 단지) '28년 준공 예정		

❖ 연도별 추진일정

단위 사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
낙동강110리 둘레길 조성						

❖ 추진실적

- 3코스(신호대교~명지 순아3구, 3.1km) : 명지국제신도시(LH공사)
 - 3-1, 3-2 공구 : '18. 공사 착공, '21. 공사 잠정 중단(명지지구개발계획변경)
 - ※ 수로관련 세부계획 수립('23. 하반기) 후 공사 재개
- 4코스(명지 순아3구~강동동 중곡, 4.7km) : 에코델타시티(수자원공사)
 - 1구역(수변공원 3호) : '18. 공사 착공
 - 2구역(수변공원 1,2호) : '22. 계약 발주
- 5코스(강동동 중곡~김해교 7.2km) : 부산시(수자원공사, 부산도시공사)
 - 제2에코델타시티 : '22. 개발구상 및 정책발표
 - 서부산권 복합산업단지 : '17. 사업추진 계획수립, '22. 연도별 산업단지 지정계획 승인
- 6코스(김해교~대저수문, 6km)
 - '22. 9. 낙동강유역환경청 하천법 관련 행정사항 협의 방문

❖ 향후 추진계획

- 3코스(신호대교~명지 순아3구, 3.1km) : 명지국제신도시(LH공사)
 - 3-1, 3-2 공구(근린공원) : '24. 상반기 공사 재개, '25. 준공 예정
 - 3-3 공구(근린공원) : '24. 상반기 공사 착공, '25. 준공 예정
- 4코스(명지 순아3구~강동동 중곡, 4.7km) : 에코델타시티(수자원공사)
 - 1구역(수변공원 3호) : '23. 3월 준공 예정
 - 2구역(수변공원 1,2호) : '23. 1월 공사 착공, '25. 준공 예정
- 5코스(강동동 중곡~김해교 7.2km) : 부산시(수자원공사, 부산도시공사)
 - 제2에코델타시티 : '23. 기본계획 수립, '24. GB해제 추진, '25. 공사 착공
 - 서부산권 복합산업단지 : '23. GB해제 추진, '24. 산업단지계획 승인, '25. 공사 착공
- 6코스(김해교~대저수문, 6km)
 - '23. 상반기 서낙동강 친수공간 구상 마스터플랜 수립 용역 발주 : 도시정비과
 - 용역 결과('24. 상반기)에 따라 둘레길 조성 검토

❖ 위치도




❖ 세부 위치도(3코스)



❖ 세부 위치도(4코스)



❖ 세부 위치도(5코스 제2에코델타시티)

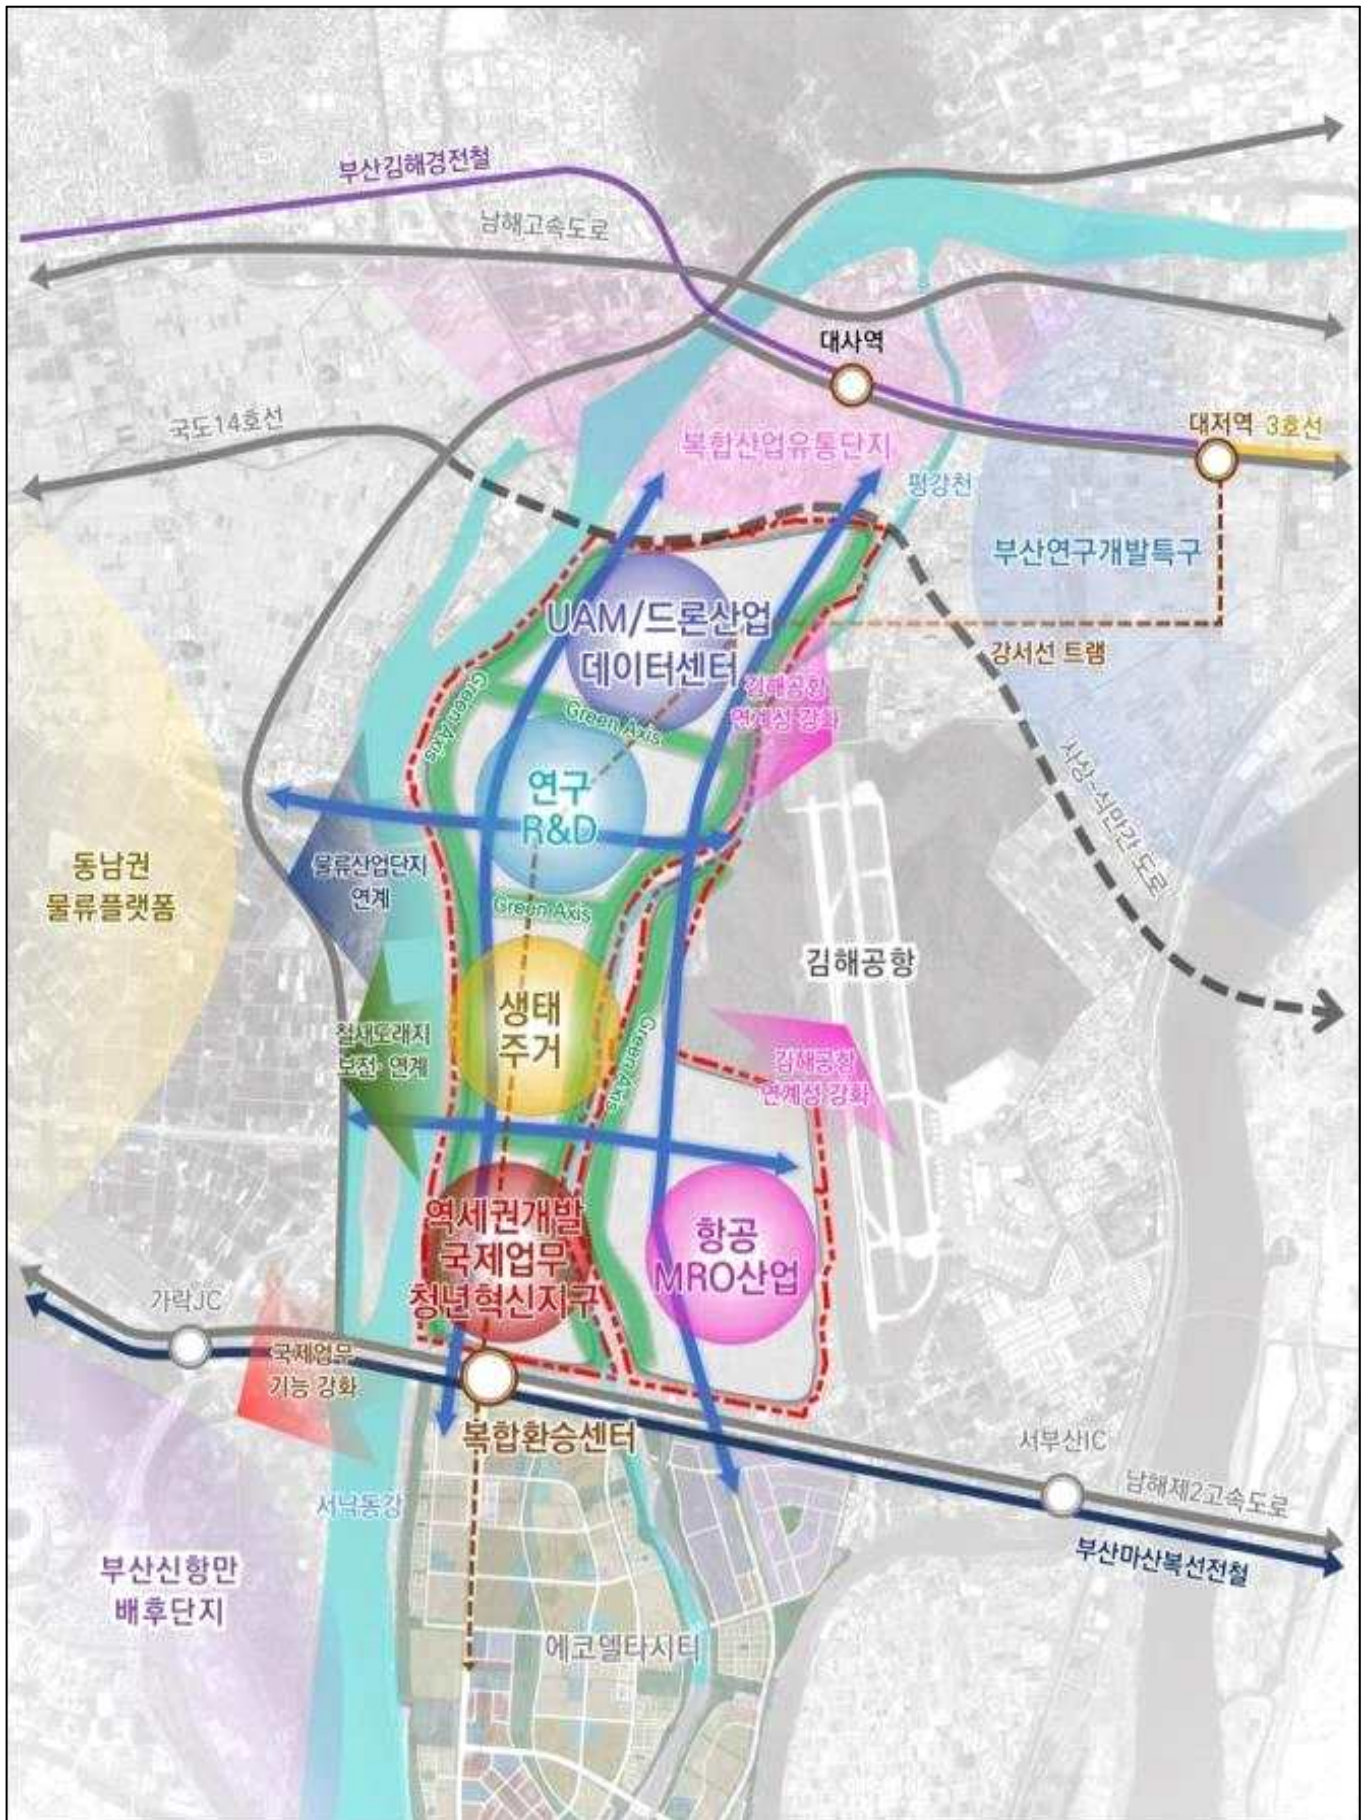

❖ 세부 위치도(5코스 서부산권 복합산업단지)

