

## 구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형 (자체, 보조, 건의)	지원사업	구 ② 분	증장기
관리 번호	6	담당 (전화번호)	강서도서관계 기적의도서관계 (☎970-2776,2319)
사업명	주민 밀착형 독서서비스 제공, 도서관 건립 추진		
주관부서	문화체육과	관련부서	
총사업비	3,138백만원(국비:882 시비:751.5 구비:1,504.5)		
추진실태	완료	추진중	미착수
	○	정상      부진	비고

### ■ 사업개요

- 지사동과 신호동에 우선적 도서관 건립
  - ① 지사동 도서관 건립
    - 위     치 : 강서구 지사동 1180번지 [지사문화회관 1개층 증축 및 2층 리모델링]
    - 사업기간 : 2018. ~ 2021.
    - 사   업   비 : 2,499백만원(건립비 2,205백만원 국·시비 70% 지원, 개관준비비 294백만원)
    - 규     모 : 연면적 893.96㎡(지사문화회관 2~3층)
    - 주요시설 : 자료실(종합/어린이), 강좌실 등
  - ② 신호동 (작은)도서관 건립 : 주민편의시설(신호문화공원) 조성과 연계 추진
    - 위     치 : 강서구 르노삼성대로 14 [신호하수처리장 일부]
    - 사업기간 : 2020. ~ 2021.
    - 사   업   비 : 639백만원(조성비 517백만원, 개관준비비 122백만원)
    - 규     모 : 233.58㎡(전용면적 156.84㎡)
    - 주요시설 : 자료실(일반/어린이), 청소년공부방, 문화교육공간 등
    - ※ 신호문화공원 개장 : 도서관, 쌈지공원, 체육시설, 갈매길 조성
- 인구 2~3만명당 도서관 1개소 건립추진(장기추진)
  - ① 에코델타시티 도서관 건립 추진
    - 위     치 : 강서구 강동동 4949번지 [제1호 근린공원 내]
    - 사업기간 : 2022.~
    - 사   업   비 \* 사업 추진시 산정
    - 규     모 : 부지 4,000㎡, 연면적 3,200㎡, 지상 4층
    - 주요시설 : 자료실(종합/어린이), 강좌실, 북카페 등
  - ② 강서구 북부권역 도서관 건립 추진
    - 사업기간 : 2022.~
    - ▷ 권역인구(2~3만) 추이에 따라 대저1동, 강동동, 가락동 등 강서구 북부권역 도서관 건립 추진

■ 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
지사동과 신호동에 우선적 도서관 건립						
-지사동 도서관 건립						
-신호동 (작은)도서관 건립						
인구 2~3만명당 도서관 1개소 건립추진(장기적)						

※ 공약사업의 각 단위사업별 추진사항을 분기단위로 표시

■ 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	3,133.4	946	709	1,478.4		3,380	946	799	1,635	
2018년										
2019년	139			139		139			139	
2020년	2,526	946	709	871		2,520	946	709	865	
2021년	468.4			468.4		721		90	631	
2022년										

○ 예산 투입 실적 : 3,138백만원(국비 882 시비 751.5 구비 1,504.5 기타)

■ 이행실적(주요성과)

① 지사동 도서관 건립

- '18. 9월 : 지사도서관 건립 운영 기본계획 수립
- '18. 11월 : 2019년~2023년 중기지방재정계획 반영(구 재정계획심의위원회)
- '18. 11월 : 지방재정 투자사업 승인(구 재정계획심의위원회)
- '19. 3월 : 공공도서관 건립지원 사업 타당성 검토결과 적정(문체부) ▶국비 확보
- '19. 5월 : 공공도서관 건립지원 사업 사전심사 적정(부산시) ▶시비 확보
- '19. 6월 : 2019년 제2회 추가경정예산 설계비(139백만원) 편성
- '19. 9월 : 구조안전진단 용역 완료
- '19. 10월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- '19. 12월 : 공원조성계획 변경 및 실시계획인가 용역 착수
- '20. 1월 : 지사도서관 설계용역 보고회 개최
- '20. 3월 : 경관심의 완료, 시비보조금(709백만원) 교부 완료
- '20. 4월 : 도시관리계획(지사공원 조성계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시
- '20. 5월 : 인테리어 디자인 및 실시설계용역 완료
- '20. 6월 ~ 7월 : 건축허가 완료, 국비보조금(946백만원) 교부 완료, 기본 및 실시설계 용역 완료, 실시계획인가, 계약심사, 공사 착공 및 추진
- '20. 8월 ~ 12월 : 개관도서 구입 및 정리, 도서관 홈페이지 구축 완료
- '21. 3월 : 건축공사 준공
- '21. 4월 : 도서관 자동화시스템 구축 완료
- '21. 6월 : 인테리어 공사 준공, 도서 배가
- '21. 7월 : 종합사인물 설치, 가구, 비품 등 구입

- '21. 8월 : 도서관 시범 운영
- '21. 9월 : 도서관 준공식 개최, 도서관 운영

② 신호동 (작은)도서관 건립 : 신호하수종말처리장 주민편의시설 조성과 연계 추진

- '19. 1월 : 총무과 신호민원센터 내 작은도서관 조성 추진
- '19. 9월 : 신호동 주차전용건축물 내 작은도서관 조성 추진
- '20. 3월 : 신호동 주차장 부지 내 도서관 조성 추진(간부T타임)
- '20. 2월 ~ 8월 : 강서구 주차장 수급실태조사 용역 진행
- '20. 9월 : 신호동 신호하수종말처리장 내 작은도서관 조성 추진
- '20. 11월 : 신호하수종말처리장 주민편의시설 조성계획 수립
- '20. 12월 : 공유재산 무상사용허가 완료(市 생활수질개선과-17821)
- '21. 2월 : 신호동 작은도서관 조성 계획 수립
- '21. 6월 : 2021년 제1회 추가경정예산(468.4백만원) 편성
- '21. 7월 : 어린이작은도서관 조성지원 사업 시비보조금(90백만원) 확보
- '21. 7월 ~ 9월 : 리모델링 공사 기본 및 실시설계 용역 착수 및 완료
- '21. 10월 : 2021년 제3회 추가경정예산(구비 163백만원) 편성
- '21. 10월 : 도서관 조성지 석면 해체 및 처리 완료
- '21. 10월 ~ 12월 : 자동화시스템 구축, 도서 및 물품 구입 등 개관 준비
- '21. 11월 ~ 12월 : 리모델링 공사 착공 및 준공
- '21. 12월 : 개관식(개장식) 개최, 도서관 개관

■ 문제점 및 대책

- ① 지사동 도서관 건립 : 해당없음
- ② 신호동 (작은)도서관 건립 : 해당없음


■ 향후계획

- ① 지사동 도서관 건립 : 완료
- ② 신호동 (작은)도서관 건립 : 완료

위치(조감)도, 관련사진



지사동 도서관

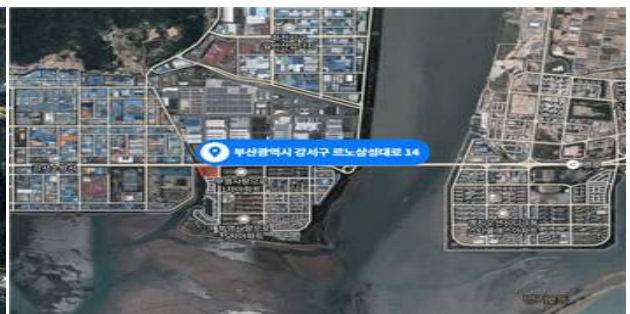

신호동 도서관



에코델타시티 도서관

