

구청장 공약사업 관리카드

① 유형	자체지원건의사업	② 구분	증장기(2022)
관리 번호	23	담당 (전화번호)	토목1, 하수 (☎970-4692) (☎970-4882)

사업명	대저지역 자연재해 위험지구 정비사업 지속 추진		
주관부서	건설과	관련부서	안전관리과

총사업비	대저1지구 : 48,374백만원 (국비: 24,187 시비: 24,187) 대저2지구 : 26,810백만원 (국비: 13,405 시비: 13,405)		
------	----------------------------------------------------------------------------------------	--	--

추진실태	완료	추진 중		미착수	비고
		정상	부진		
	○				건설사업으로 사업개시완료

■ 사업개요

- 대저1 자연재해위험개선지구 정비사업
 - 신덕배수펌프장(Q=1,500m³/min, V=12,000m³), 사덕배수펌프장(Q=310m³/min, V=3,000m³)
- 대저2 자연재해위험개선지구 정비사업
 - 덕두배수펌프장 설치(Q=255m³/min, V=5,000m³), 동방배수펌프장 성능개선(Q=720m³/min, V=7,000m³)

■ 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
대저1자연재해위험개선지구 정비사업 - 사덕배수펌프장 및 유수지	[Progress bar]					
대저1자연재해위험개선지구 정비사업 - 신덕배수펌프장 및 유수지	[Progress bar]					
대저2자연재해위험개선지구 정비사업 - 동방배수펌프장 및 유수지	[Progress bar]					
대저2자연재해위험개선지구 정비사업 - 덕두배수펌프장 및 유수지	[Progress bar]					

■ 재원조달

대저1 자연재해위험개선지구 정비사업 (단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	48,374	24,187	24,187			48,374	24,187	24,187		
2017년까지	4,000	2,000	2,000			4,000	2,000	2,000		
2018년	11,250	7,500	3,750			11,250	7,500	3,750		
2019년	6,150	4,400	1,750			6,150	4,400	1,750		
2020년	10,000	5,000	5,000			10,000	5,000	5,000		
2021년	14,818	4,218	10,600			14,818	4,218	10,600		
2022년	2,156	1,069	1,087			2,156	1,069	1,087		

○ 예산 투입 실적 : 36,291백만원(국비 23,118 시비 13,173)

대저2 자연재해위험개선지구 정비사업

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	26,810	13,405	13,405			26,810	13,405	13,405		
2017년까지	1,000	500	500			1,000	500	500		
2018년	10,410	8,550	1,860			10,410	8,550	1,860		
2019년	3,359	1,500	1,859			3,359	1,500	1,859		
2020년	9,355	2,855	6,500			9,355	2,855	6,500		
2021년	2,686	-	2,686			2,686	-	2,686		
2022년										

○ 예산 투입 실적 : 19,000백만원(국비 12,534, 시비 6,466)

■ 이행실적(주요성과)

1. 대저1 자연재해위험개선지구 정비사업

- '15.03. : 자연재해위험개선지구 지정 및 지형도면 고시(면적 2,482,625m²)
- '15.06.23. : 기본 및 실시설계용역 착수 ('17. 12. 21 용역준공)
- '16.12.01. : 사전설계검토 심의(국민안전처) ▷ 조건부 승인
- '17.01.~05. : 도시계획시설 결정 등 각종 관련기관 협의
- '17.08.~09. : 부산광역시 설계VE 심의
- '17.11.~12. : 부산광역시 건설기술심의
- '18.03. : 부산광역시 (공사)계약심사 [사덕배수펌프장]
- '18.04. : 계약심의위원회 심의 및 공사 조달계약 의뢰
- '18.06. : 사덕배수펌프장 감리용역 착수
- '18.08. : 사덕배수펌프장 공사 착공
- '19.08. : 신덕배수펌프장 공사 1차 착공 (1차 준공 `20.06.)
- '20.03. : 신덕배수펌프장 공사 2차 착공 (2차 준공 `21.09.)
- '20.10. : 사덕배수펌프장 공사 준공
- '21.05. : 신덕배수펌프장 공사 3차 착공
- '21.12. : 신덕배수펌프장 공사 3차 설계변경 및 잔여공사 발주 완료

2. 대저2 자연재해위험개선지구 정비사업

- '15.03. : 자연재해위험개선지구 지정 및 지형도면 고시(면적 789,545m²)
- '16.06. : 기본 및 실시설계용역 착수['16.6.27.~'17.4.22.]
- '16.12.~ '17.01. : 주민설명회(2회)
- '17.02. : 용역 일시정지(행정절차 완료시까지)
- '17.12. : 행정안전부 사전설계심의[조건부 승인]
- '18.01.~02. : 부산광역시 설계VE 및 대저2동 주민설명회(1회)
- '18.03.~04. : 부산광역시 건설기술심의
- '18.05. : 공법심의, 사업수행능력평가(PQ) 및 도시계획시설 결정 등 관련사항 협의
- '18.06. : 공사(감리) 발주계획 보고
- '18.07. : 공사 조달계약 의뢰(조달청) 및 감리 사업수행능력평가(PQ)
- '18.08. : 공사 조달청(설계서 검토) 및 감리 입찰(낙찰자 선정 및 적격심사)
- '18.09. : 감리용역 착수
- '18.10. : 1차 공사 착공 (1차 준공 `20.02.)
- '19.05. : 2차 공사 착공 (2차 준공 `20.07.)
- '20.04. : 3차 공사 착공

■ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

■ 향후계획

- 지속적인 예산확보를 위한 관련기관(행정안전부, 부산광역시)과 적극적인 협의 추진
- '22년 상반기 대저1 자연재해위험개선지구 정비사업, 대저2 자연재해위험개선지구 정비사업 준공을 통해 사업성과 제고

1. 대저1 자연재해위험개선지구 정비사업


- '22. 5. : 신덕배수펌프장 공사 3차 및 전체 준공

2. 대저2 자연재해위험개선지구 정비사업

- '22. 3. : 전체공사 준공

위치(조감)도, 관련사진

대저1 자연재해위험개선지구 정비사업

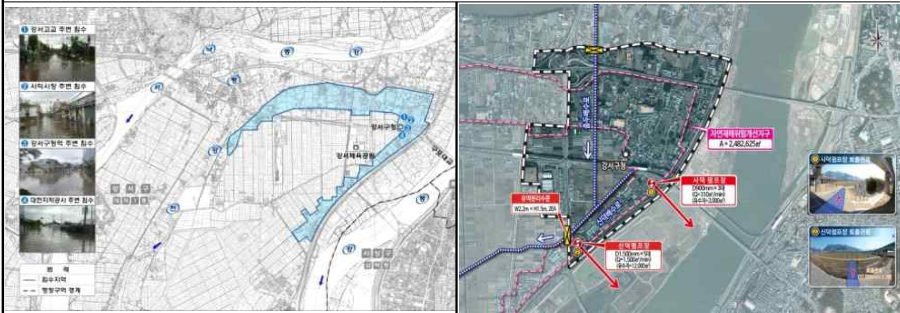

대저2 자연재해위험개선지구 정비사업

