20 가덕도 야생화 군락 특화단지 조성

[녹지공원과 ☏970-4545]

사 업 목 표

우리 꽃을 볼 수 있는 야생화 자연체험학습장 조성으로 관광명소 육성을 통한 지역경제 활성화 기여

추진방향

- 천혜의 자연환경과 많은 식물 종을 보유한 가덕도 내에 다양한 우리 꽃을 볼 수 있는 야생화 군락 특화단지 조성
- 관광명소로 육성하여 지역경제 활성화 및 주민 삶의 질 향상에 기여

우선순위 : 중기사업(2021년) ➪이행완료

사업개요

- 가덕도 야생화 군락단지 조성사업(1차)
  - ▹ 위　　치 : 강서구 대항동 산13-2번지 일원
  - ▹ 사업기간 : 2020. 5. 19. ~ 6. 17.
  - ▹ 소요예산 : 200백만원(구비)
  - ▹ 주요내용
    - 조경수 식재 : 수국 13,720주, 애기동백 23주
    - 다년생 초화류 파종(區 직영) : 금계국 등 15종 5,000㎡
    - 시설물 설치 : 쉼터 2개소, 산책로 284m, 급수시설 등
- 가덕도 야생화 군락단지 조성사업(2차)
  - ▹ 위　　치 : 강서구 대항동 산13-2번지 일원
  - ▹ 사업기간 : 2020. 9. ~ 11.
  - ▹ 소요예산 : 172백만원(시비)
  - ▹ 주요내용
    - 조경수 식재 : 수국 8,250주
    - 목교(L=6.0m, W=1.8m) 1개소 및 등의자 등 편의시설물 설치
    - 관수시설, 안전로프 등 관리시설물 설치

▪ 가덕도 야생화 군락단지 조성사업(3차, 대항동 지역특화 조림사업)

▹ 위　　치 : 강서구 대항동 162-1번지 일원

▹ 사업면적 : 5ha

▹ 사업기간 : 2021. 2. ~ 5.

▹ 소요예산 : 104백만원(국 52 시 16 구36)

▹ 주요내용 : 동백나무 1,110주 식재

※ 재원확보현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	476			372	104	
국 비	52				52	
시 비	188			172	16	
구 비	236			200	36	
기 타						

세부 추진계획

(단위 : 백만원)

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
	총 계		476	
야생화 군락 특화단지 조성	2018년	▪ 예산신청 → 미반영		
	2019년	▪ 토지사용협의 → 조건부 동의(국방부) ▪ 예산신청 → 미반영		
	2020년	▪ 사업시행 및 준공 (야생화군락단지 1·2차 사업)	372	시 172 구 300
	2021년	▪ 사업시행 및 준공 (야생화군락단지 3차 사업)	104	국 52 시 16 구 36

연도별 추진일정

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
야생화 군락 특화단지 조성 토지사용 협의		▬▬▬				
사업추진			▬▬▬	▬▬▬		

추진실적

- ’18. 1. : 2019년도 균형발전특별회계 생활기반계정 예산요구(미확보)
- ’19. 1. : 토지사용 협조 요청〔녹지공원과-124(2019.1.3.)〕
  2020년도 균형발전특별회계 생활기반계정 예산요구
- ’19. 2. : 국방부 조건부 토지사용 동의
- ’20. 6. : 1차 조성사업 완료
- ’20. 11. : 2차 조성사업 완료(포부대주변 공지 및 진입도로 일원)
- ’21. 4. : 3차 조성사업 완료

향후 추진계획

- 원활한 관리를 위해 관리인원 예산(54,068천원)을 편성하였으며, 가덕도 야생화 군락단지의 철저한 사후 관리 운영

위 치 도

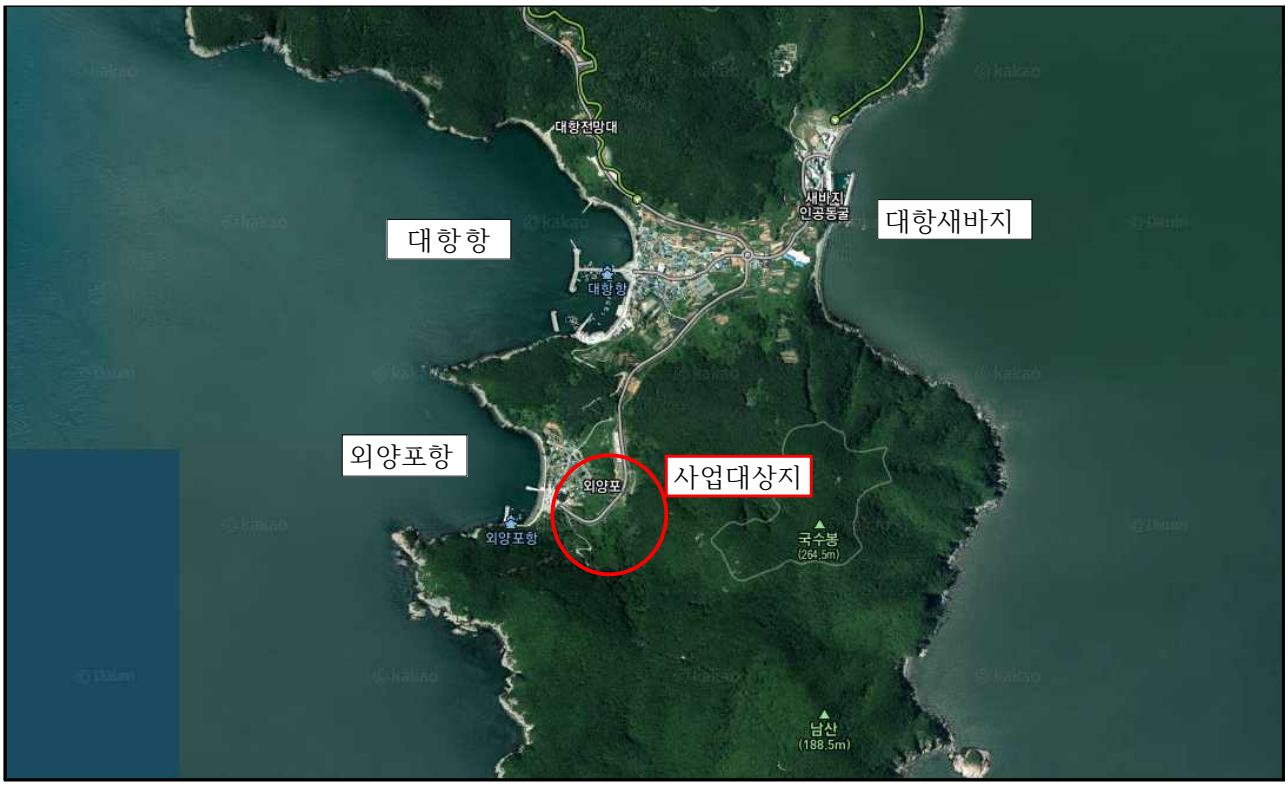
대항전망대
새바지
인공동굴
대항새바지
대항항
대항항
외양포항
외양포
사업대상지
외양포항
국수봉
(264.5m)
남산
(188.5m)

1차 사업
산13-23임
산13-25 임
2차 사업
3차 사업
162-1 임
162-1 임

현장사진

1차 사업 대상지

2차 사업 대상지

2차 사업 대상지

3차 사업 대상지
